



Uchelgais Gogledd Cymru
Ambition North Wales

Cynllun Twf Gogledd Cymru Adroddiad Perfformiad Chwarterol

2024-25 Chwarter 1 (Ebrill - Mehefin 2024)

CYNNWYS

01	Crynodeb y Cyfarwyddwr Portffolio	3
02	Perfformiad y Portffolio	4
03	Perfformiad y Rhaglen Ddigidol	5
04	Perfformiad y Rhaglen Ynni Carbon Isel	7
05	Perfformiad y Rhaglen Tir ac Eiddo	10
06	Perfformiad y Rhaglen Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	13
07	Perfformiad y Rhaglen Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	15
08	Olrhain Cynnydd y Prosiectau	17
09	Piblinell Cyflawni Prosiectau'r Cynllun Twf- Achos Fusnes y Portffolio 2023	18
10	Traciwr Amcanion - Trosolwg o gyflawni (Mehefin 2024)	19
11	Proffil Gwariant Grant y Cynllun Twf	20
12	Prosiectau'r Cynllun Twf: Proffil Dyranriad Cyllid Cyfalaf	21
	ATODIAD A - Crynodeb o Brosiectau y Cynllun Twf	22

01 CRYNODEB Y CYFARWYDDWR PORTFFOLIO

Dros y chwarter diwethaf, rhoddwyd y brif sylw i ddatblygu cyfres gref o achosion busnes i'w cymeradwyo'n gan y Bwrdd Uchelgais. Mae'r rhain yn cynnwys y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol, LPWAN, Cydnerth, Rhwydwaith Talent Twristiaeth, Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy, Di-wifr Uwch a Pharc Bryn Cegin.

Yn ystod y chwarter cymeradwyodd y Bwrdd Uchelgais yr Achos Busnes Llawn ar gyfer prosiect cyn-Ysbyty Gogledd Cymru. Mae hwn yn garreg filltir arwyddocaol ar gyfer y Cynllun Twf, fydd yn arwain at ddatblygu'r safle gan gynnwys adnewyddu'r adeilad rhestredig Gradd 2*, datblygu tai newydd a gofodau gwyrdd, cyfleuster sgiliau a hyfforddi ynghyd â dros 1,000m² o ofod masnachol. Caiff y cytundeb Adran 106 ei gyflwyno i bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Dinbych ym mis Gorffennaf, ac mae'r trafodaethau ar y cytundeb ariannu ym mynd rhagddynt gyda Jones Bros.

Mae rhai o'n brosiectau wedi gwneud cynnydd rhagorol dros y chwarter. Mae'r gwaith o adeiladu'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn symud yn ei flaen yn dda. Lansiodd y broses gaffael ar gyfer adnewyddu ac offer opteg a'r elfen hydrogen. Mae Prifysgol Bangor wedi lansio 4 tendr ar gyfer y Ganolfan Prosesu Signal Digidol, ac mae Grŵp Llandrillo Menai wedi lansio galwad ar gyfer is-ganolfan (spoke) olaf y Rhwydwaith Talent Twristiaeth.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar ffrydiau gwaith wedi'u hariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin:

- Penodwyd Annog Cyf i gyflwyno rhaglen i gefnogi **cymunedau** i wella eu band eang drwy ymgyrch ymgysylltu i hyrwyddo amrywiol ffrydiau o gyllid a gwybodaeth; ynghyd â chefnogaeth uniongyrchol i helpu cymunedau sydd â'r band eang gwaethaf.
- Mae BIC Innovation yn cyflwyno prosiect sy'n darparu cyngor ac arweiniad i **fusnesau bach** ar sut y gallant fabwysiadu'r technolegau cyfathrebu digidol diweddaraf.
- Lansiodd y pecyn cymorth Ysgrifennu Ceisiadau Ynni Lleol Blaengar. Mae'r tendr yn fyw ar Gwerthwchi Gymru i adnabod rhestr o gyflenwyr, ac mae'r broses **ymgeisio ar agor** i fusnesau bach a chanolig (SMEs), mentrau cymdeithasol a sefydliadau cymunedol i gaffael ymgynghorydd ar ysgrifennu ceisiadau.

Mewn partneriaeth gyda chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, lansiodd gwedd 2 y prosiect Allyriadau a Bioamrywiaeth gyda'r amcan o symleiddio'r dull yn unol â phrosesau achosion busnes llywodraeth leol; a hyfforddi dros 75 o reolwyr prosiect a phenderfynwyr ar draws Cymru sut i ddefnyddio'r dull.

Mae Miller Associates wedi cyflwyno adroddiad ymchwil 'Cryfhau Systemau Bwyd Lleol a Rhanbarthol yng Ngogledd Cymru'. Comisiynwyd yr ymchwil gan Uchelgais Gogledd Cymru, ar sail dull systemau cyfan i edrych ar ystyriaethau economaidd, iechyd, tldi ac amgylcheddol. Caiff yr adroddiad ei gwblhau'n derfynol a'i rannu'n rhanbarthol yn ystod y chwarter nesaf.

Mae'r chwarter nesaf yn argoeli i fod yn gyfnod prysur gyda nifer o brosiectau yn targedu cymeradwyaeth i'r achosion busnes gan y Bwrdd Uchelgais.



Alwen Williams
Cyfarwyddwr Portffolio
Uchelgais Gogledd Cymru

02 PERFFORMIAD Y PORTFFOLIO

Themâu	Statws RAG	Sylwadau
Achos Busnes y Portffolio		Cymeradwywyd diweddariad 2023 Achos Busnes y Portffolio gan y Bwrdd ym mis Hydref ac mae wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel rhan o'r broses dyfarnu cyllid flynyddol.
Piblinell Cyflawni		Mae'r biblinell gyflenwi wedi cael ei hadolygu a'i diweddarau fel rhan o ddiweddariad Achos Busnes Portffolio 2023. Bydd y prosiectau bellach yn adrodd yn erbyn yr amserlen ddiwygiedig hon.
Llywodraethu		Mae'r Fframwaith Rheoli Portffolio, Rhaglenni a Phrosiectau bellach wedi'i sefydlu gyda'r Bwrdd Portffolio a'r pum Bwrdd Rhaglen yn gweithredu'n effeithiol. Mae gweithdrefn Gwrthdaro Buddiannau yn ei lle ar draws yr holl Fyrddau.
Sicrwydd		Mae'r pedwerydd adolygiad sicrwydd blynyddol y Cynllun Twf (Adolygiad Sicrwydd Rhaglenni) wedi'i gwblhau ym mis Hydref 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Coch' ar gyfer y portffolio. Cynhaliwyd adolygiad dilynol Sicrwydd Cynllun Gweithredu (AAP) ym mis Rhagfyr 2023, gyda'r adroddiad yn cyflawni gradd hyder 'Ambr-Gwyrdd'. Bydd yr adolygiad nesaf yn digwydd yn ystod mis Hydref 2024. Mae'r Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) wedi comisiynu adolygiad annibynnol o Lywodraethu a Sicrwydd, sydd i'w gwblhau erbyn canol mis Gorffennaf.
Adnoddau a Chapasiti		Mi fydd y Rheolwr Rhaglen y Cynllun Twf yn gadael ei swydd ddiwedd fis Awst; mae'r broses recriwtio ar gyfer y swydd wedi dechrau, gyda chyfweiliadau wedi'u trefnu yn ystod wythnos gyntaf mis Gorffennaf. Ar ôl cael eu cymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd yn mis Mawrth, mae contractau tymor penodol (heb gynnwys staff a ariennir gan LEAP neu SPF) wedi'u hymestyn i fis Mawrth 2026, gan leihau'r risg y bydd staff yn gadael yn y tymor byr.
Cyllid		Mae cyfanswm o £4.49m o arian y Cynllun Twf wedi cael ei wario hyd yma. Roedd hyn yn cynnwys £2.15m ar y Ganolfan Prosesu Signal Digidol, £0.75m ar y Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter ac £1.22m i ariannu'r gwariant refeniw.
Buddsoddiad		Mae sicrhau'r buddsoddiad sector cyhoeddus a phreifat sydd ei angen i gyflawni'r Cynllun Twf yn parhau i fod yn risg arwyddocaol ar draws y portffolio. Bu'r Bwrdd Uchelgais gymeradwyo'r Strategaeth Fuddsoddi yn ystod eu cyfarfod ym mis Mawrth 2024.
Risg		Mae'r proffil risg cyffredinol yn parhau i fod yn gyson â Chwarter 4. Mae'r risg o ran capasiti wedi lleihau oherwydd recriwtio diweddar i'r Swyddfa Rheoli Portffolio, ond ychwanegwyd risg newydd at y gofrestr i gynnwys y bwriad o drosglwyddo'r tîm a'r Cynllun Twf i'r Cyd-bwyllgor Corfforedig y Gogledd. Mae nifer o risgiau gweddilliol uchel yn parhau sy'n cael eu rheoli gan y Swyddfa Rheoli Portffolio gan gynnwys fforddiadwyedd, materion caniatâd, oedi a buddsoddiad.
Monitro a Gwerthuso Buddion		Mae sesiynau hyfforddi wedi'u cynnal gydag Uchelgais Gogledd Cymru a Noddwyr Prosiectau ar sut i ddefnyddio'r plattform Adrodd am Fuddion a ddatblygwyd dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae'r prosiectau wedi uwch lwytho eu dangosyddion, a byddant yn dechrau poblogi'r plattform dros yr wythnosau nesaf, er mwyn galluogi i'r timau prosiect, rhaglen a phortffolio i dracio cynnydd tuag at amcanion a buddion gwariant.
Allyriadau a Bioamrywiaeth		Mewn partneriaeth gyda chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, lanswyd gwedd 2 y prosiect Allyriadau a Bioamrywiaeth gyda'r amcan o (1) symleiddio'r dull yn unol â phrosesau achosion busnes llywodraeth leol a (2) hyfforddi dros 75 o reolwyr prosiect a phenderfynwyr ar draws Cymru sut i ddefnyddio'r dull.
Cyfathrebu ac Ymgysylltu		Yn ystod y chwarter, cyhoeddwyd datganiadau i'r wasg ar 'Gwasanaethau 4G a band eang cyflym i Ogledd Cymru' a'r Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Rhannwyd manylion ar y cyfryngau cymdeithasol am weithgareddau a ariannwyd gan SPF ac am swydd Rheolwr Rhaglen y Cynllun Twf. Parhau i dyfu wnaeth ein hymgysylltiad a'n cyrhaeddiad ar y cyfryngau cymdeithasol, gyda dros 6,000 o ddefnyddwyr y wefan.

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Nod y Rhaglen

Cyflawni newid amlwg yn y cysylltedd digidol sydd ei angen i sicrhau y gall Gogledd Cymru gyflawni galw'r defnyddwyr, cynnal cyflymdra gyda gweddill y DU, datgloi potensial sectorau a safleoedd â blaenoriaeth am dwf a thanategu ecosystem arloesi ffyniannus.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi
GVA
£158m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£41.7m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">Ers i'r Bwrdd Uchelgais gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Allweddol '4G+' ym mis Mawrth, mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygu'r Achos Busnes Llawn, gan gynnwys paratoadau ar gyfer ymgysylltu â'r farchnad.Cwblhawyd Adolygiad Porth 2 ar Achos Busnes Amlinellol Di-wifr Uwch Campysau Cysylltiedig ym mis Mai, gyda canlyniad o raddfa Ambr. Mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i'r afael â'r argymhellion cyn ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais.Mae gwaith ar y gweill ar brosiectau rhanbarthol i gefnogi busnesau bach a chanolig i ymchwilio i dechnolegau newydd ac i wella cysylltedd band eang mewn cymunedau lleol; wedi'i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin.



Cyng. Mark Pritchard
Aelod Arweiniol



David Fitzsimon
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Stuart Whitfield
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

03 PERFFORMIAD Y RHAGLEN DDIGIDOL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Prosesu Signal Digidol Prifysgol Bangor	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Achos Cyfiawnhad Busnes Cam 3 (terfynol) wedi'i ddrafftio ar gyfer adolygiad Uwch Berchennog Cyfrifol mewnol y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno'r achos cyfiawnhad busnes terfynol ar gyfer trydydd gwedd y cyllid i brynu offer. 		<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad o'r drafft cyntaf o'r achos cyfiawnhad busnes gan y Swyddfa Rheoli Portffolio (PMO) wedi'i gynnal. Mae gwaith pellach ar y gweill gan Prifysgol Bangor i'w gwblhau.
Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Oedi ar ddatblygu'r prosiect cyn derbyn canlyniad caffael traws-ranbarthol Prosiect Gigabit Llywodraeth y DU (BDUK) (disgwylir ym mis Gorffennaf 2024); Penodwyd Annog Cyf. i ymgymryd â phrosiect cefnogi cysylltedd gwledig wedi'i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin. Ymgyrch ymgysylltu â'r gymuned ar gyfer y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Disgwylir canlyniad cychwynnol caffael Llywodraeth y DU ar gyfer Prosiect Gigabit erbyn y chwarter nesaf, pan fydd yr opsiynau ar gyfer buddsoddi rhanbarthol yn cael eu hadolygu. Bydd cefnogaeth ffrydiau gwaith y Gronfa Ffyniant Gyffredin ar gyfer cymunedau yn parhau. 		<ul style="list-style-type: none"> Buddsoddiad Llywodraeth y DU mewn band eang yn y rhanbarth i ddechrau yn dilyn y broses gaffael bresennol ar gyfer ei fframwaith 'traws-ranbarthol'. Bydd canlyniad hyn yn diffinio eiddo ar gyfer ymyrraeth y Cynllun Twf; Dechreuodd gwaith i hyrwyddo uwchraddiadau lleol yn ym mis Ebrill, wedi'i ariannu gan SPF, o dan arweiniad Uchelgais Gogledd Cymru ac yn cael ei gyflwyno gan Annog Cyf.
Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru <ul style="list-style-type: none"> 4G+ Ffeibr Llawn 	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu'r Achos Busnes Llawn (4G+) Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol (Ffeibr Llawn) 	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r gwaith paratoi ar gyfer ymgysylltu â'r farchnad ar gyfer y prosiect 4G+ wedi cychwyn. 	<ul style="list-style-type: none"> Oedi ar ddatblygu'r prosiect ffibr gan ddisgwyl am ganlyniad caffael traws-ranbarthol Prosiect Gigabit Llywodraeth y DU (BDUK) (disgwylir ym mis Gorffennaf 2024) Ymgysylltu â'r farchnad 4G+ 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect yn awr yn mynd rhagddo i ymgysylltu â'r farchnad a chaffael; Bydd y prosiect ffibr yn ail-gychwyn yn dilyn canlyniad caffael traws-ranbarthol Llywodraeth y DU ar gyfer band eang gigabit.
Campysau Cysylltiedig Uchelgais Gogledd Cymru <ul style="list-style-type: none"> Di-wifr Uwch LPWAN 	<ul style="list-style-type: none"> Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol (Di-wifr Uwch) Datblygu'r Achos Cyfiawnhad Busnes (LPWAN) 	<ul style="list-style-type: none"> Prosiect SPF i gyflawni asesiadau cysylltedd ar gyfer SMEs ledled y rhanbarth i gefnogi amcanion y prosiect Di-wifr Uwch wedi cychwyn; Adolygiad Porth 2 o'r prosiect Di-wifr Uwch wedi'i gwblhau; Newidiadau i'r Achos Cyfiawnhad Busnes Cam 3 LPWAN wedi'i ddrafftio ar gyfer yr adolygiad terfynol. 	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyaeth i Achos Cyfiawnhad Busnes gan y Bwrdd Uchelgais Cwblhau'r camau gweithredu yn dilyn yr Adolygiad Porth 2 Di-wifr Uwch 		<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth 2 ar gyfer Di-wifr Uwch wedi'i gwblhau gydag argymhellion clir i weithredu arnynt cyn ei ystyried gan y Bwrdd Uchelgais; Achos Cyfiawnhad Busnes LPWAN wedi'i ddiweddarau cyn yr adolygiad gan y Bwrdd Portffolio a'r Bwrdd Uchelgais.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Nod y Rhaglen

Datgloi buddion economaidd prosiectau ynni carbon isel trawsffurfiol a sefydlu Gogledd Cymru fel un o leoliadau arweiniol y DU ar gyfer cynhyrchu ynni carbon isel, arloesedd a buddsoddi yn y gadwyn gyflenwi.



Targed Creu Swyddi
980



Targed Buddsoddi
GVA
£530m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£668.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Egni - Mae Cam 3 RIBA yn gwneud cynnydd da ac yn barod i'w lofnodi'n derfynol.• Safle Treuliad Anaerobig Glannau Dyfrdwy - Cynnydd cadarnhaol wedi'i wneud i oresgyn materion allweddol yn ymwneud â chytundeb ariannu cyn cyflwyno'r Achos Busnes Llawn i'r Bwrdd Uchelgais am ystyriaeth.• NEW-H2 - gwedd nesaf y sesiwn denu y chwarter hwn er mwyn bwrw ymlaen â datblygu'r achos busnes.• Hwb Hydrogen Caergybi - mae'r prosiect yn gobeithio cryfhau'r sefyllfa pryniant 'offtake' ar gyfer Hydrogen cyn symud i'r camau nesaf.• Cydnherth - Mae'r Achos Busnes Amlinellol wedi'i orffen yn derfynol a chaiff ei gyflwyno i'r Bwrdd Uchelgais i'w ystyried ym mis Gorffennaf.• Ynni Lleol Blaengar - Mae dogfennau tendr Ymgynghorydd y Gronfa wedi'u cwblhau'n derfynol. Mae'r amserlen ar gyfer lansio'r tendr ac adolygu'r cyflwyniadau i osgoi cyfnodau gwyliau'r haf yn cael ei gynllunio.



Cyng. Llinos Medi
Aelod Arweiniol



Dylan Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Elgan Roberts
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Cydnherth (Morlais) Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar benawdau telerau benthyciad gyda Menter Môn Morlais Cyf. Sefyllfa sicrwydd ar gyfer benthyciad wedi'i gytuno mewn egwyddor gyda WEFO. Cytunwyd ar benawdau telerau drafft rhwng Menter Môn Morlais Cyf. a Llywodraeth Cymru. Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol yn derfynol. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau trefniadau ariannu Llywodraeth Cymru. Cynnal trafodaethau gyda WEFO i negodi unrhyw gymalau posib yng nghytundeb ariannu cyfredol WEFO er mwyn hwyluso cytundeb benthyciad Uchelgais Gogledd Cymru gyda Menter Môn Morlais Cyf. Cychwyn caffael (yn amodol ar gymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol). 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol wedi'i gwblhau'n derfynol ac yn cael ei ystyried am gymeradwyaeth.
Hwb Hydrogen Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Cynnal y sesiynau denu ('onboarding') cyntaf gydag noddwr newydd y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyflwyno cam nesaf y sesiynau denu. Cwblhau'r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda noddwr y prosiect. Cadarnhau amserlen datblygu'r achos busnes. 		<ul style="list-style-type: none"> Ychydig o oedi gyda'r broses o benodi'r noddwr, ond ni effeithir ar yr amserlenni cyffredinol gyda'r noddwr yn mynd drwy'r broses ddenu.
Egni Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Parhau gyda gwaith ar ddatblygu Cam 3 RIBA 	<ul style="list-style-type: none"> Cymeradwyo'r cynllun caffael. Cymeradwyo Cam 3 RIBA a dechrau ar broses gaffael 2 gam ar gyfer prif gontractwr. Parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Llawn. 		<ul style="list-style-type: none"> Y prosiect ar y trywydd cywir ar y cyfan. Ychydig o lithriad i amserlen datblygu Cam RIBA y gellid ei grafangu yn ôl ar gyfer Achos Busnes Llawn.
Ynni Lleol Blaengar Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Dogfennau tendr wedi'u cwblhau. Pecyn cefnogi ysgrifennu cyflwyniadau wedi'i ariannu gan SPF. 	<ul style="list-style-type: none"> Ail-lansio tendr Ymgynghorydd y Gronfa. Parhau i esblygu'r dull gofynnol o reoli cymhorthdal. Cwblhau'r strategaeth fuddsoddi a'r Achos Busnes Llawn drafft. 		<ul style="list-style-type: none"> Bydd caffael Ymgynghorydd y Gronfa yn cael ei rhyddhau'n fuan ar Gwerthwchi Gymru. Bydd yr ansicrwydd yn parhau nes ddaw'r broses honno i ben.

04 PERFFORMIAD Y RHAGLEN YNNI CARBON ISEL

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Trawsfynydd Cwmni Eginio	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol Strategol	<ul style="list-style-type: none"> Disgwyl am benderfyniadau gan Great British Nuclear (GBN) a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd. 	<ul style="list-style-type: none"> Dim camau gweithredu sylweddol wedi'u cynllunio nes bod penderfyniadau yn cael eu gwneud gan Great British Nuclear (GBN) a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd. 		<ul style="list-style-type: none"> Statws RAG yn goch gan fod y penderfyniadau sydd eu hangen gan Great British Nuclear a Llywodraeth y DU ar ddewis technoleg a dewis safleoedd fisoedd i ffwrdd, sy'n cynyddu'r ansicrwydd ar amserlenni cyflawni'r rhaglen.
Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy The Circular Economy Developments	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y ffordd ymlaen ar gyfer mwyafrif gofynion y cytundeb ariannu. 	<ul style="list-style-type: none"> Cytuno ar y ffordd ymlaen ar gymalau'n ymwneud â rheoli cymhorthdal. Cwblhau asesiad rheoli cymhorthdal. Gweithredu argymhellion yr Achos Busnes Amlinellol sy'n weddill a chyflwyno Achos Busnes Llawn i'w gymeradwyo. 		<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ariannu i'w gwblhau ac asesiadau rheoli cymhorthdal i'w cwblhau cyn y gellir cyflwyno Achos Busnes Llawn ar gyfer cymeradwyaeth. Mae'r statws RAG yn adlewyrchu'r oedi gafwyd ers cymeradwyo'r Achos Busnes Amlinellol.
Hwb Hydrogen Caergybi Menter Môn	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Cyfarfodydd rheolaidd gyda DESNZ a Llywodraeth Cymru i drafod y gofynion rheoli cymhorthdal ac i alinio'r dull yn well. Archwilio cyfleoedd posib gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau cytundebau 'offtake'. 	<ul style="list-style-type: none"> Trafodaethau pellach gyda Llywodraeth Cymru a DESNZ i archwilio cyfleoedd ariannu posib i sicrhau cytundebau 'offtake' gan y sector cyhoeddus. Cynnal asesiad cymhorthdal gyda rhagolygon ariannol diweddaraf y prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Statws RAG bellach yn goch gan fod cyflawni 50% 'offtake' yn dibynnol ar ymrwymiad y sector cyhoeddus, sy'n parhau i fod yn ansicr.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Nod y Rhaglen

Mynd i'r afael â'r diffyg tir ac eiddo addas ar gyfer twf busnes a dod â safleoedd ymlaen ar gyfer datblygiadau tai. Cyflawni gwelliannau sy'n symbylu buddsoddiad mewn safleoedd ac eiddo ym mhorthladd Caergybi a'r ardal ehangach. Hwyluso rhaglenni eraill drwy sicrhau bod y seilwaith tir ac eiddo cywir ar gael.



Targed Creu Swyddi
2280



Targed Buddsoddi
GVA
£129bn



Cyfanswm
Buddsoddiad
£355.4m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">• Warren Hall, Brychdyn - Mae ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru yn symud ymlaen gyda'u hadolygiad o addasrwydd safleoedd y prosiectau i gydymffurfio ag achos diogelwch maes awyr Penarlâg.• Porth y Gorllewin, Wrecsam - Mae Trafnidiaeth i Gymru wedi cwblhau asesiad Canllawiau Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) O fel achos diwygiedig dros newid. Mae'r Cyngor bellach yn comisiynu adolygiad WelTAG Lite i ddiwallu'r profion buddsoddi priffyrdd.• Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych - Cafodd Achos Busnes Llawn ei gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Mai 2024. Bwriedir i Bwyllgor Cynllunio Cyngor Sir Ddinbych ystyried y cytundeb A106 ym mis Gorffennaf. Mae trafodaethau ar y Cytundeb Ariannu gyda Jones Bros yn mynd rhagddo. Mae Memorandwm Dealltwriaeth Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro wedi'i gwblhau gan y Cyngor a'i ddychwelyd i Lywodraeth y DU.• Porth Caergybi - Mae achos busnes amlinellol prosiect i ehangu Porthladd Caergybi wedi'i gwblhau'n sylweddol. Mae Stena Line Ports Limited wedi gofyn am amser ychwanegol i gwblhau eu trafodaethau masnachol perthnasol.• Parc Bryn Cegin, Bangor - Mae'r ymgynghorydd, SP Projects, wedi darparu lluniadau cynllun, cynlluniau llawr a lluniadau drychiad ynghyd â manylion y costau ym mis Mehefin a chytunwyd arnynt gan yr holl bartion. Mae'r Achos Busnes Amlinellol drafft wedi'i gwblhau'n sylweddol. Mae cyfarfodydd tîm prosiect rheolaidd ar y gweill.• Stiwdios Kinmel -- Stage 50 Ltd wedi'i roi yn nwylo'r gweinyddwyr ar ddechrau Ebrill gan eu prif ariannwr. Mae trafodaethau arfaethedig wedi'i rhaglennu rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Uchelgais Gogledd Cymru a'r unigolion allweddol oedd ynghlwm wrth y cynnig gwreiddiol, a fydd i'w cynnal ym mis Gorffennaf er mwyn ystyried a oes modd datblygu cais diwygiedig.• Porth Wrecsam - Yn dilyn cadarnhad Llywodraeth y DU y bydd 300 a mwy o swyddi'r Gwasanaeth Sifil yn cael eu hadleoli o Lundain/Siroedd Cartref i Wrecsam, cwblhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yr Achos Busnes Amlinellol a gefnogwyd gan y Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo ym mis Mehefin. Bydd y Cyngor yn awr yn datblygu'r Achos Busnes Amlinellol a'r cais cynllunio.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth y Gorllewin, Wreccsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wreccsam yn caffael ymgynghorydd i ddarparu asesiad WelTAG Lite ar gyfer llif traffig yn 2024. 	<ul style="list-style-type: none"> Dechrau asesiad WelTAG Lite ar gyfer llif traffig a niferoedd diwygiedig ar gyfer y prosiect. 		<ul style="list-style-type: none"> Newidiwyd graddfa risg y prosiect i ambr yn dilyn y Gweinidog ar gyfer Gogledd Cymru a Trafnidiaeth yn nodi y gallai Llywodraeth Cymru benderfynu adolygu argymhellion yr Adolygiad Ffyrdd ar Brosiectau Cyfalaf Prifffyrdd y dyfodol.
Warren Hall, Brychdyn Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru yn parhau gyda'u profion cydymffurfiaeth ar gyfer yr achos diogelwch maes awyr ar safle'r prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Adroddiad ymgynghorwyr Llywodraeth Cymru ar gallu'r safleoedd i gydymffurfio ag achos diogelwch y maes awyr. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg y prosiect yn dal yn ambr gan fod adolygu achos diogelwch y maes awyr yn aros am asesu'n llawn a'i gytuno gan Airbus UK.
Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Sir Ddinbych Jones Bros (Ruthin) Limited / Cyngor Sir Ddinbych	Mae'r Achos Busnes Llawn wedi ei gymeradwyo, a mae'r prosiect yn symud ymlaen tuag at gyflawni.	<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Llawn wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Mai 2024. Memorandwm Dealltwriaeth Rownd 3 y Gronfa Ffyniant Bro wedi'i gwblhau gan y Cyngor a'i ddychwelyd i Lywodraeth y DU. Noddwr y prosiect i gyflwyno dogfennau i'r Awdurdod Cynllunio ar y cytundeb A106, cydymffurfiaeth ag amodau cynllunio a thrwyddedau Cynefinoedd. 	<ul style="list-style-type: none"> Cyfeiriad Cefnogaeth Cymhorthdal i'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd i'w gofrestru ar wefan yr Awdurdod. Cwblhau'r cytundeb ariannu gyda Jones Bros. A106 wedi'i gymeradwyo gan y Cyngor. Jones Bros yn dechrau'r gwaith Gwedd 1. 		<ul style="list-style-type: none"> Y prosiect yn cadw ei raddfa risg gwyrdd gan bod yr Achos Busnes Llawn wedi ei gymeradwyo gyda gwaith ar y cytundeb ariannu a rheoli cymhorthdal yn mynd yn dda.
Parc Bryn Cegin, Bangor Llywodraeth Cymru / Uchelgais Gogledd Cymru	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol.	<ul style="list-style-type: none"> SP Projects wedi cwblhau'r pecyn darluniau, meintiau llawr yr unedau a manylion y costau wedi eu cytuno. Mwyafrif o'r Achos Busnes Amlinellol a'r dogfennau cysylltiol wedi eu cwblhau. 	<ul style="list-style-type: none"> Adolygiad Porth 2 i'w gynnal ym mis Medi. Cwblhau'r Achos Busnes Amlinellol a dechrau ar y broses gymeradwyo. Trafodaethau ar y cais cyn cynllunio i gychwyn. 		<ul style="list-style-type: none"> Y prosiect yn cadw ei raddfa risg gwyrdd gan ei fod ar y trywydd cywir i gyflwyno Achos Busnes Amlinellol i'r Bwrdd Uchelgais yn yr Hydref.

05 PERFFORMIAD Y RHAGLEN TIR AC EIDDO

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Porth Caergybi Stena Line Ports Limited	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Mae Stena wedi gofyn am oedi i datblygiad y prosiect tra'n disgwyl am ganlyniad eu trafodaethau masnachol gyda'r sector ynni ar y môr. 	<ul style="list-style-type: none"> Cytundeb ar delerau rhwng Stena a defnyddwyr terfynol masnachol. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn cael ei gadw ar ambr gan bod trafodaethau gyda defnyddwyr terfynol ardaloedd newydd y porthladd yn pahau.
Stiwdios Kinmel	Mae'r prosiect yn cael ei adolygu	<ul style="list-style-type: none"> Stage Fifty Ltd wedi'i roi yn nwylo'r gweinyddwyr ym mis Ebrill ac yn debygol o gael ei ddiddymu yn dilyn talu'r credydwyr o aseda'r cwmni. Trafodaethau ar y gweill gyda'r cyn Reolwr Gyfarwyddwr i weld a oes ariannwr newydd ar gyfer y prosiect. 	<ul style="list-style-type: none"> Cynigion diwygiedig i'w cyflwyno am ystyriaeth ar gyfer y prosiect erbyn diwedd mis Awst 2024. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn goch ar ôl i Stage Fifty fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.
Porth Wrecsam Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Amlinellol Strategol wedi'i gefnogi gan y Bwrdd Rhaglen Tir ac Eiddo ym mis Mehefin. 	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Cyngor ar fin dechrau datblygu'r Achos Busnes Amlinellol a'r Cais Cynllunio. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa risg yn wyrdd gan fod y prosiect yn symud i'r cam nesaf.



Cyng. Jason McLellan
Aelod Arweiniol



Andrew Farrow
Uwch Berchennog
Cyfrifol



David Mathews
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Nod y Rhaglen


Bydd y Rhaglen Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth yn uchafu cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant yng Ngogledd Cymru gan ddarparu cyfleusterau cefnogol i sicrhau bod gan y rhanbarth y sgiliau i ragori ac i fod gyda'r gorau yn y byd. Bydd y Rhaglen hefyd yn sicrhau ffyniant drwy fanteisio i'r eithaf mewn modd cynaliadwy ar ein hamgylchedd a'n tirwedd.



Targed Creu Swyddi
380



Targed Buddsoddi GVA
£281m



Cyfanswm Buddsoddiad
£41.3m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r prosiect Antur Gyfrifol wedi parhau i ddatblygu'r Achos Busnes Amlinellol drwy ymweliadau safle gyda rhanddeiliaid a pharatoi ar gyfer ceisiadau cyn-cynllunio. Mae'r Rhwydwaith Talent Twristiaeth a'r Swyddfa Rheoli Portffolio wedi gweithio ar y cyd i gwblhau'r caffael a'u Hachos Busnes Llawn ochr yn ochr â rheoli ymarfer ail-frandio, prosiect ymgysylltu â myfyrwyr wedi'i ariannu gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin a dewis is-ganolfan derfynol y prosiect. Mae Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon yn ystyried opsiynau ar ôl derbyn adborth ar eu harolygon amgylcheddol wedi'u diweddarau gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd i archwilio'r bwloch amaeth/garddwriaeth yn y Cynllun Twf wedi derbyn adroddiad ymchwil drafft ac maent yn gweithio gyda'r bwrdd rhaglen a rhanddeiliaid ehangach i gwblhau'r adroddiad cyn iddo gael ei rannu'n rhanbarthol.



Cyng. Charlie McCoubrey
Aelod Arweiniol



Sioned Williams
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)



Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

06 PERFFORMIAD Y RHAGLEN BWYD-AMAETH A THWRISTIAETH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Newid yr Uwch Berchennog Cyfrifol (SRO) o Martin Jardine fel SRO dros-dro i Gwenllian Roberts. Mae gweddill o'r arolygon amgylcheddol wedi'u cwblhau a'u rhannu gyda Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae cynlluniau prosiect diwygiedig wedi'u diweddarau a'u rhannu gyda Cyngor Gwynedd. 	<ul style="list-style-type: none"> Ystyried adborth gan Cyngor Gwynedd a Chyfoeth Naturiol Cymru. Penderfynu os am baratoi cais cynllunio llawn. Datblygu'r Achos Busnes Llawn ymhellach. 		<ul style="list-style-type: none"> Mae'r graddfa yn parhau i fod yn goch oherwydd oedi gyda'r prosiect a'r materion a godwyd fel rhan o'r ceisiadau cynllunio.
Rhwydwaith Talent Twristiaeth Grŵp Llandrillo Menai	Datblygu'r Achos Busnes Llawn	<ul style="list-style-type: none"> Newid yr Uwch Berchennog Cyfrifol o Lawrence Wood i Gwenllian Roberts. Y Swyddfa Rheoli Portffolio yn cefnogi gyda pharatoadau caffael gyda phartneriaid yr Is-ganolfan. Proses a dogfennaeth ar gyfer dewis Is-ganolfan Derfynol wedi'i ddrافتio a'i rannu gyda'r Swyddfa Rheoli Portffolio. Gwaith parhaus ar asesiadau allyriadau a bioamrywiaeth, cytundeb ariannu a chynllunio gweithredol. 	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Achos Busnes Llawn yn derfynol a'i gyflwyno i'r Swyddfa Rheoli Portffolio i'w gymeradwyo. Cynnydd gydag ail-frandio'r prosiect. Parhau gyda proses ddethol derfynol ar gyfer yr Is-ganolfan. Cynnydd gyda'r gweithgareddau ail-frandio. 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Llawn yn cael ei baratoi ar gyfer cymeradwyaeth ym mis Medi 2024.
Anturiaethau Cyfrifol ZipWorld	Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol	<ul style="list-style-type: none"> Achos Amlinellol Strategol wedi'i gymeradwyo gan y Bwrdd Rhaglen. Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid drwy ddau weithdy Achos Busnes Gwell ar wahân gan ystyried atyniadau ymwelwyr ac agweddau trafndiaeth y prosiect. Datblygu'r Achos Busnes Amlinellol. 	<ul style="list-style-type: none"> Ymgysylltu â rhan-ddeiliaid drwy rhagor o weithdai Achos Busnes Gwell. Paratoi Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Adolygiad Porth a'r broses gymeradwyo. Cyflwyno ceisiadau cyn-cynllunio perthnasol. 		<ul style="list-style-type: none"> Achos Busnes Amlinellol yn cael ei baratoi ar gyfer cymeradwyaeth y Bwrdd Uchelgais ym mis Tachwedd 2024.

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Nod y Rhaglen


Cyfnertu lleoliad Gogledd Cymru fel clwstwr gweithgynhyrchu gwerth uchel pwerus ac arloesol, sy'n adeiladu ar arbenigedd presennol ac arbenigedd byd-eang i greu sail economaidd gwerth uwch, mwy amrywiol sy'n cefnogi trosglwyddo i economi carbon isel.



Targed Creu Swyddi
180



Targed Buddsoddi
GVA
£114m



Cyfanswm
Buddsoddiad
£39.5m

Statws RAG	Sylwebaeth Rheolwr y Rhaglen
	<ul style="list-style-type: none">Mae'r gwaith o adeiladu'r Ganolfan Opteg a Pheirianeg Menter yn symud yn ei flaen yn dda. Mae caffael pellach ar gyfer y prosiect (adnewyddu opteg, offer y prosiect, elfen hydrogen) wedi'i lansio.Mae Prifysgol Bangor wedi bod yn cwblhau eu Hachos Cyfiawnhad Busnes ac yn rheoli'r caffael cysylltiedig cyn i'w ystyried gan y Bwrdd Uchelgais ym mis Gorffennaf 2024.



Cyng. Dyfrig Siencyn
Aelod Arweiniol



Tony Ward
Uwch Berchennog
Cyfrifol



Robyn Lovelock
Rheolwr Rhaglen



Cyflawni yn ôl y Cynllun a dim ond mân materion i roi sylw iddynt (dim angen gweithredu)



Cyflawni ychydig ar ei hôl hi a/neu mân faterion/materion cymedrol i roi sylw iddynt (camau rheoli yn eu lle)




Cyflawni ar ei hôl hi'n sylweddol a/neu materion sylweddol i roi sylw iddynt (angen gweithredu ar frys)

07 PERFFORMIAD Y RHAGLEN ARLOESI MEWN GWEITHGYNHYRCHU UWCH

Prosiect (Ariannwr y Prosiect)	Cam y Prosiect	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter hwn)	Cerrig Milltir Allweddol (y chwarter nesaf)	Statws RAG	Rhesymeg RAG
Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter Prifysgol Wrecsam	Cyflawni Prosiect	<ul style="list-style-type: none"> Cyhoeddi tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC a phrynu offer. Seremoni llofnodi trawst yng nghampws Plas Coch, gyda'r gwaith adeiladu yn parhau yn unol â'r amserlen. 	<ul style="list-style-type: none"> Gwerthuso tendrau ar gyfer y gwaith OpTIC a phrynu offer. Parhau i weithio ar sgopio tendr hydrogen a'r offer sy'n weddill. 		<ul style="list-style-type: none"> Prosiect ar y trywydd cywir.
Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol Prifysgol Bangor	Datblygu'r Achos Cyfiawnhad Busnes	<ul style="list-style-type: none"> Cwblhau'r Achos Cyfiawnhad Busnes yn derfynol cyn ei ystyried gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd. Paratoi Cytundeb Ariannu. 	<ul style="list-style-type: none"> Cais am gymeradwyaeth gan y Bwrdd Uchelgais Economaidd i'r Achos Cyfiawnhad Busnes Cwblhau'r caffael ar gyfer y cytundeb gwaith (adnewyddu Henfaes) a gwedd gyntaf prynu'r offer. 		<ul style="list-style-type: none"> Graddfa wedi'i ddiwygio o Goch i Ambr yn dilyn Adolygiad Porth ac adolygiad gan y Swyddfa Rheoli Portffolio.

09 PIBLINELL CYFLAWNI PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

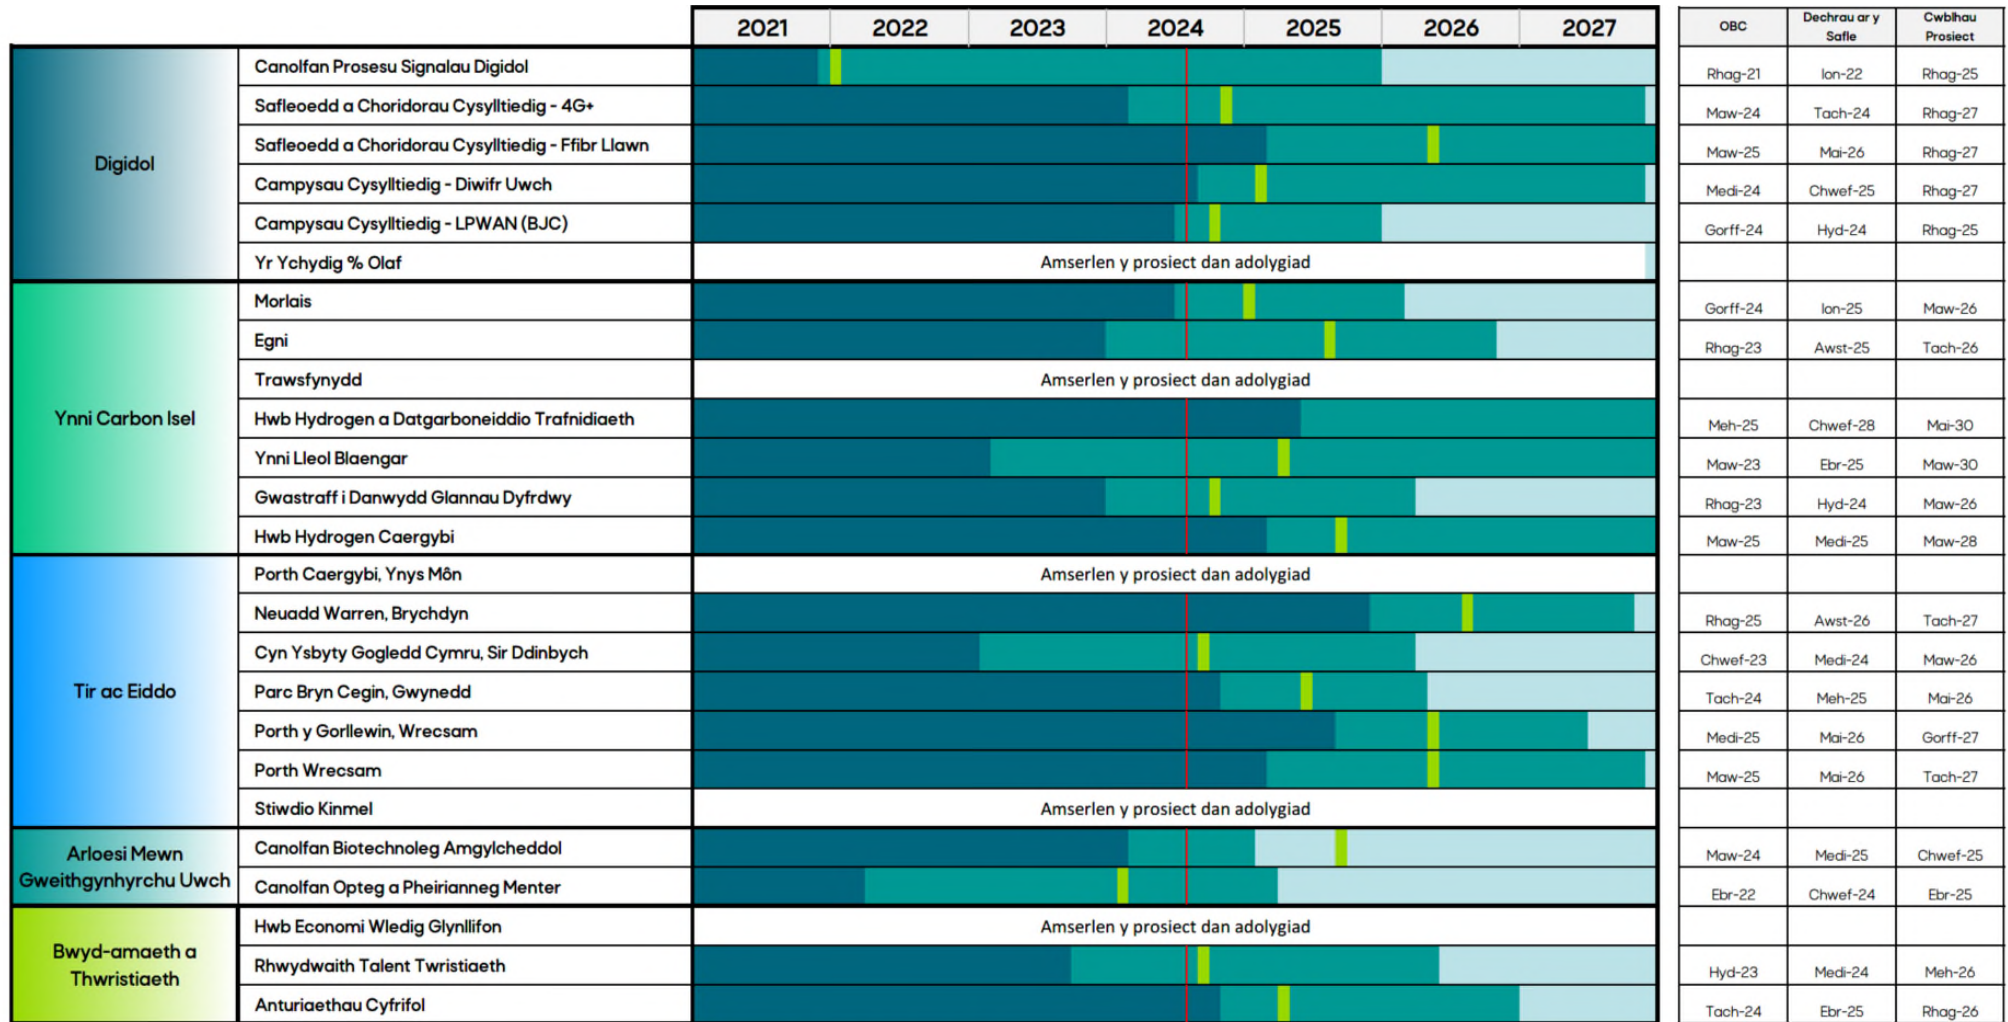

■ Cyfnod Datblygu a Chymeradwyo Achos Busnes (Cymeradwyo Achos Busnes Amlinellol cyn caffael)
■ Cam Caffael a Chyflawni Prosiect (Yn cynnwys cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn ar ôl caffael)

■ Dechrau ar y Safle
■ Cyfnod Gweithredol a Gwireddu Manteision

10 TRACIWR AMCANION – TROSOLWG O GYFLAWNI

		Targedau 2023 Achos Busnes y Portffolio			Targedau Achosion Busnes y Prosiectau sydd				Gwahaniaeth			
		GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	OBC FBC	GVA (EM)	Swyddi a grëwyd (net)	(EM) Cyfanswm Buddsoddiad*	Swyddi a grëwyd	(EM) Cyfansw	GVA (EM)	
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	10	35	2.96	FBC	12	33	3.0	+2	-2	+0.04	
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	10	135	4.17	OBC	15	130	4.0	+5	-5	-0.17	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	4G+	50	115	9.40	OBC	9	TBC at FBC	8.5	n/a	n/a	n/a
		Fibre				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Campysau Cysylltiedig	30	0	20.68	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	30	100	8.87	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	35	90	28.42	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Egni	30	50	8.00	OBC	19	49	10.0	-11	-1	+2	
	Ynni Lleol Blaengar	130	230	102.00	OBC	122	174	106.0	-8	-56	+4	
	Trawsfynydd	70	505	244.12	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Hwb Hydrogen Caergybi	20	20	28.77	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	20	40	63.28	OBC	34	65	60.0	+14	+25	+1.72	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	120	360	43.36	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Warren Hall, Brychdyn	120	445	69.76	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	10	50	99.94	FBC	35	70	107.0	+25	+20	+7.06	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	20	50	5.91	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Caergybi	370	925	181.44	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Porth Wrecsam	10	150	14.37	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Stiwdios Kinnel	50	200	32.00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Bwyd-Amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	30	95	16.79	OBC	45	96	13	+15	+1	-3.79	
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	10	5	12.94	OBC	35.3	68	12.88	+25.3	+63	-0.06	
	Anturiaethau Cyfrifol	20	175	12.40	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Arloesi mewn Gweithygyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	30	60	16.42	FBC	70	70	18.12	+40	+10	+1.7	
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	30	90	3.50	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Cyfanswm Portffolio Cynllun Twf		Targedau			8OBC + 3FBC	Wedi gymeradwyo			Gwahaniaeth (Wedi gymeradwyo v Targed)			
		1,255	3,925	1,029		396.3	755	342.5	-858.7	-3,170	-686.5	

* Cyfanswm buddsoddiad yn cynnwys 1.5% o gostau'r Swyddfa Rheoli Portffolio

** OBC - Achos Busnes Amlinellol, FBC - Achos Busnes Llawn

11 CYNLLUN TWF – PROFFIL GWARIANT CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Ariannwr y Prosiect	2021/22 (£m)	2022/23 (£m)	2023/24 (£m)	2024/25 (£m)	2025/26 (£m)	2026/27 (£m)	2027/28 (£m)	2028/29 (£m)	2029/30 (£m)	2030/31 (£m)	2031/32 (£m)	2032/33 (£m)	2033/34 (£m)	2034/35 (£m)	Cyfanswm (£m)
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.12	1.66	0.37	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Digidol	Safleoedd a Charidorau Allweddol Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	4.00	2.00	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Digidol	Campws Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	10.10	4.93	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.68
Digidol	Cysylltu ychydig ganrannau olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17
Ynni carbon isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	4.44	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.87
Ynni carbon isel	Egni (Canolfan Ragoriaeth Ynni Carbon Isel)	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94
Ynni carbon isel	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Egin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	2.50	5.00	5.70	5.00	0.00	19.70
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.23
Ynni carbon isel	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.75	3.00	9.25	9.25	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.63
Ynni carbon isel	Gwastraff i Danwydd Glannau Dyfrdwy*	The Circular Economy Ltd	0.00	0.00	0.00	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
Ynni carbon isel	Hwb Hydrogen Caerdybi*	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
Tir ac eiddo	Porth Caerdybi	Stena Line	0.00	0.00	0.00	7.64	17.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.47
Tir ac eiddo	Safle Strategol Warren Hall	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.77
Tir ac eiddo	Safle cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	3.90	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94
Tir ac eiddo	Safle Strategol Parc Bryn Cegin	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.91
Tir ac eiddo	Porth Gorllewinol, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.96
Tir ac eiddo	Stiwdio Kinmel*	Stage Fifty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80
Tir ac eiddo	Porth Wrecsam*	Cyngor Bwrdeistref Sirof Wrecsam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth L	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.96
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth L	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Glyndŵr	0.00	0.00	0.75	6.52	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.55
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Hwb Economi Wledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43
Bwyd-amaeth a thwrstiaeth	Anturiaethau Cyfrifal*	Zip World	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	3.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2.15% ar gyfer ariannu cyllideb referniw y BUEGC			0.22	0.28	0.56	1.10	1.15	0.82	0.30	0.15	0.15	0.10	0.10	0.10	0.07	0.05	5.15
Cyfanswm Portffolio			0.34	1.94	1.68	23.92	58.68	68.65	44.81	19.71	1.65	2.60	5.10	5.80	5.07	0.05	240.00

*Prosiectau newydd

12 PROSIECTAU'R CYNLLUN TWF: PROFFIL DYRANIAD CYLLID CYFALAF

Rhaglen	Prosiect	Noddwyr Prosiect	Proffil 24/25 (£m)	YTD Gwirioneddol	Amrywiad (£m)*	Rhesymeg
Digidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol	Prifysgol Bangor	0.81	0.00	-0.81	Disgwylir i'r BJC ar gyfer y prosiect DSP gael ei gymeradwyo cyn yr hawliad ariannol nesaf.
	Cysylltu'r Ychydig Ganrannau Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	Nid oes unrhyw geisiadau busnes llawn wedi'u cymeradwyo. Disgwylir gwariant yn ail hanner y flwyddyn yn dilyn cymeradwyaeth Achosion Busnes Llawn.
	Hwb Hydrogen a Datgarboneiddio Trafnidiaeth	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Egni	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	0.75	0.00	-0.75	
	Gorsaf Bŵer Trawsfynydd	Cwmni Eginio	0.00	0.00	0.00	
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	The Circular Economy Development	3.20	0.00	-3.20	
	Hwb Hydrogen Caerdybi	Menter Môn	0.00	0.00	0.00	
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	Mae Cytundeb Cyllid ar gyfer Prosiect Cyn Ysbyty Gogledd Cymru yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd, ac mae disgwyl i'r hawliad ariannol ddilyn yn gynnar yn y prosiect. Mae gwariant ar Borth Caerdybi o dan risg yn 2024-25 oherwydd oedi presennol y prosiect.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	3.90	0.00	-3.90	
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	0.00	0.00	0.00	
	Porth Caerdybi	Stena Line	7.64	0.00	-7.64	
	Stiwdios Kinmel		0.00	0.00	0.00	
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	0.00	0.00	0.00	
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	Nid oes ceisiadau busnes llawn wedi'u cymeradwyo. Disgwylir gwariant 2024-25 yn gynt na'r amserlen ar gyfer Rhwydwaith Talent Twristiaeth.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	0.00	0.00	0.00	
	Anturiaethau Gyfrifol	Zip World	0.00	0.00	0.00	
Arloesi mewn Gweithgynhyrchu Gwerth Uchel	Canolfan Opteg a Pheirianeg Menter	Prifysgol Wrecsam	6.52	0.37	-6.15	Mae'r hawliad cyntaf ar gyfer yr EEOC wedi'i dalu. Disgwylir gwariant yn 2024-25 ar gyfer Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn gynt na'r disgwyl.
	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol	Prifysgol Bangor	0.00	0.00	0.00	
Costau'r Swyddfa Rheoli Portffolio			1.1	0.16	-0.94	
Cyfanswm			23.92	0.53	-23.39	

ATODIAD A – CRYNODEB O BROSIECTAU'R CYNLLUN TWF

	Prosiect	Noddwr	Crynodeb
uDigidol	Canolfan Prosesu Signal Digidol (DSP)	Prifysgol Bangor	Bydd y prosiect yn galluogi i'r Ganolfan Prosesu Signal Digidol ymestyn ei bresenoldeb a'i gylch gwaith, gan integreiddio'n llawn gyda'r Prosiect Strategaeth Cenedlaethol a galluogi datblygu asedau allweddol ar raddfa, gan gynnwys prawfi 5G, capasiti ymchwil ac offer o'r radd flaenaf.
	Yr Ychydig % Olaf	Uchelgais Gogledd Cymru	Mae'r prosiect hwn yn targedu gwasanaeth cyflym iawn hollgynhwysol ar draws y Gogledd, nad ydynt yn cael eu gwasanaethu hyd yma gan ddulliau eraill ac na allant gyflawni cyflymder o 30Mbps (lawrlwytho) o leiaf ar hyn o bryd.
	Safleoedd a Choridorau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Nod y prosiect yw ceisio gwella dibynadwyedd ac ansawdd gwasanaethau symudol ar y prif ffyrdd a rheilffyrdd yn y Gogledd, gan alluogi gwasanaethau ffibr llawn i safleoedd masnachol allweddol ledled y rhanbarth. Canolbwyntio ar ddatblygu rhwydweithiau ffiberoptic sy'n hanfodol ar gyfer darparu band eang 4G, 5G a gigabit.
	Campysau Cysylltiedig	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd y prosiect yn ceisio cyflymu datblygiad ystod o opsiynau cysylltedd digidol gyda ffoocws cyfredol ar 18 o safleoedd economaidd rhanbarthol allweddol.
Ynni Carbon Isel	Cydnherth (Morlais)	Menter Môn	Buddsoddi mewn seilwaith i gysylltu â rhwydwaith y National Grid a monitro effeithiau amgylcheddol morol. Bydd hyn yn galluogi cynnydd yn y defnydd o dyrbinau gan ddatblygwyr morol a chynhyrchu ynni adnewyddadwy.
	NEW-H2	Uchelgais Gogledd Cymru	Cefnogi cyflwyniad prosiect arddangos sy'n ymwneud â chynhyrchu hydrogen gwyrdd o ffynonellau ynni carbon isel a'i ddefnydd mewn rhwydweithiau trafniadaeth rhanbarthol.
	Egni	Prifysgol Bangor	Buddsoddi mewn datblygu'r isadeiledd ym Mhrifysgol Bangor a Pharc Gwyddoniaeth Menai, gwella galluedd y Gogledd a'r DU ar gyfer arloesedd mewn ynni carbon isel a meysydd cysylltiedig, gan helpu i greu'r amodau ar gyfer mewnffuddsoddiad newydd a thwf busnes yn y gadwyn gyflenwi ynni carbon isel yn y Gogledd.
	Ynni Lleol Blaengar	Uchelgais Gogledd Cymru	Er mwyn helpu i gyflawni targedau ynni adnewyddadwy, datgarboneiddio a pherchnogaeth leol, bydd y prosiect yn cefnogi prosiectau hwyluso arloesol ac arddangoswyr sy'n goresgyn methiannau'r farchnad a datglai buddsoddiad sector preifat a chymunedol mewn datrysiadau ynni lleol blaengar.
	Trawsfynydd	Cwmni Eginio	Mae'r safle wedi'i leoli'n unigryw ar gyfer gwneud defnydd 'Cyntaf o'i Fath' o Adweithydd Modwlar Bychan (SMR) neu Adweithydd Modwlar Uwch (AMR). Ar y cyd â'r sector cyhoeddus a phreifat, bydd y Cynllun Twf yn cyfrannu cyllid tuag at isadeiledd galluogi ar gyfer y datblygiad hwn.
	Gwaith Treulio Anaerobig Glannau Dyfrdwy	The Circular Economy Ltd	Cynnig i greu cyfleuster i drosi 182,000 tunnell y flwyddyn o wastraff bwyd masnachol sydd ar y ffordd i dirlenwi/i gael ei losgi yn ynni a gwrtaith bio-methan gwyrdd, ynni a gwrtaith.
	Hwb Hydrogen Caergybi	Menter Môn	Bydd y prosiect yn adeiladu cyfleuster cynhyrchu hydrogen gwyrdd ym Mharc Cybi, Caergybi, gan gynhyrchu oddeutu 2000+kg/y dydd o hydrogen gwyrdd, gan gyflenwi cwsmeriaid trafniadaeth y ffordd, morwrol a rheilffordd ar draws Gogledd Cymru.
Tir ac Eiddo	Porth y Gorllewin, Wrecsam	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno'r prif wasanaethau fel bod modd dod â'r safle i'r farchnad i'w werthu a'i ddatblygu.
	Warren Hall, Brychdyn	Uchelgais Gogledd Cymru	Cyflwyno prif wasanaethau fel bod modd i'r safle defnydd cymysg 65 hectar gael ei roi ar y farchnad ar werth ac yna gael ei ddatblygu gan y sector preifat.
	Parc Bryn Cegin, Bangor	Uchelgais Gogledd Cymru	Darparu arwynebedd llawr diwydiannol i fodloni'r galw hysbys am unedau.
	Cyn Ysbyty Gogledd Cymru, Dinbych	Uchelgais Gogledd Cymru	Bydd arian y Cynllun Twf yn cynorthwyo yng nghyflwyniad safle wedi'i glirio a'i adfer gyda phrif wasanaethau er mwyn dwyn ymlaen datblygiad preswyl a masnachol defnydd cymysg.
	Porth Caergybi	Stena Line	Sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi drwy ddarparu cyfleusterau mordeithio a llwytho trwm dŵr dwfn, gwella mynediad cerbydol, gwarantu dyfodol y morglawdd a darparu ar gyfer galwadau prosiectau ynni rhanbarthol.
	Porth Wrecsam	Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam	Mae'r prosiect hwn yn ddatblygiad cynaliadwy o ardal fywiog wedi'i hadfywio, sy'n creu canolbwynt i gefnogi buddsoddiad busnes a hwb trafniadaeth aml-ddull gyda chysylltiadau at deithio llesol.
	Stiwdios Kinmel		Bydd y prosiect hwn yn dylunio, adeiladu a gweithredu stiwdios ffilm a theledu ym Mharc Menter Tir Llwyd, ynghyd ag academi hyfforddi ac unedau deori.
Bwyd-amaeth a Thwristiaeth	Canolbwynt Economi Gwledig Glynllifon	Grŵp Llandrillo Menai	Y weledigaeth yw creu Canolbwynt Economi Gwledig arbennig o'r radd flaenaf yng Nglynllifon, sy'n cynnig ystod o gyfleusterau a gwasanaethau i gryfhau a gwella'r economi rhanbarthol, yn benodol drwy dyfyr sector bwyd a diod.
	Rhwydwaith Talent Twristiaeth	Grŵp Llandrillo Menai	Sicrhau dyfodol yr ystod o ddarpariaeth sgiliau a chynyddu buddion masnachol o un o'r sectorau mwyaf sefydledig yn y rhanbarth. Bydd y rhwydwaith talent yn ysgogi cydweithrediad cyhoeddus-preifat i gydlyn gweithrediad ar sgiliau a datblygu cynnyrch i drawsnewid a sbarduno twf y sector twristiaeth a lletygarwch yn y rhanbarth.
	Anturiaethau Cyfrifol	Zip World	Prosiect aml-elfen fel rhan o becyn twristiaeth gynaliadwy ac eco-dwristiaeth gan gynnwys Car Cebel newydd a chynaliadwy, Slate Explorer gan gynnwys plattform gwyllo i ymwelwyr a Rhwydwaith eFws.
Arloes mewn gweithgynhyr chu gwerth	Canolfan Biotechnoleg Amgylcheddol (CEB)	Prifysgol Bangor	Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn ganolfan gyda'r gorau yn y byd o ran canfod a nodweddu ensymau newydd o bwys diwydiannol. Bydd y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol yn darparu sylfaen gref ar gyfer denu ymchwilwyr blaenllaw ar lefel fyd-eang, cyllid ymchwil cyhoeddus a masnachol arwyddocaol a mewnffuddsoddiad i Gymru.
	Canolfan Opteg a Pheirianneg Menter	Prifysgol Wrecsam	Bydd y Ganolfan Opteg a Pheirianneg Menter yn darparu cyfleusterau sydd wedi'u targedu i roi hwb i ddatblygu sgiliau lefel uchel i'r rhanbarth a galluogi i fusnesau bach a chanolig eu maint a busnesau mawr weithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ymchwil a datblygu opteg, cyfansoddion a thanwydd cell hydrogen sy'n cael ei yrru'n fasnachol.
